




Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

PROJETS NAWARA & TATAOUINE

54, Avenue Mohamed V - 1002 Le Belvédère, Tunisie
Tél. : (+216) 71 28 53 00 - Fax : (+216) 71 90 22 82



SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PROJET NAWARA-TATAOUINE

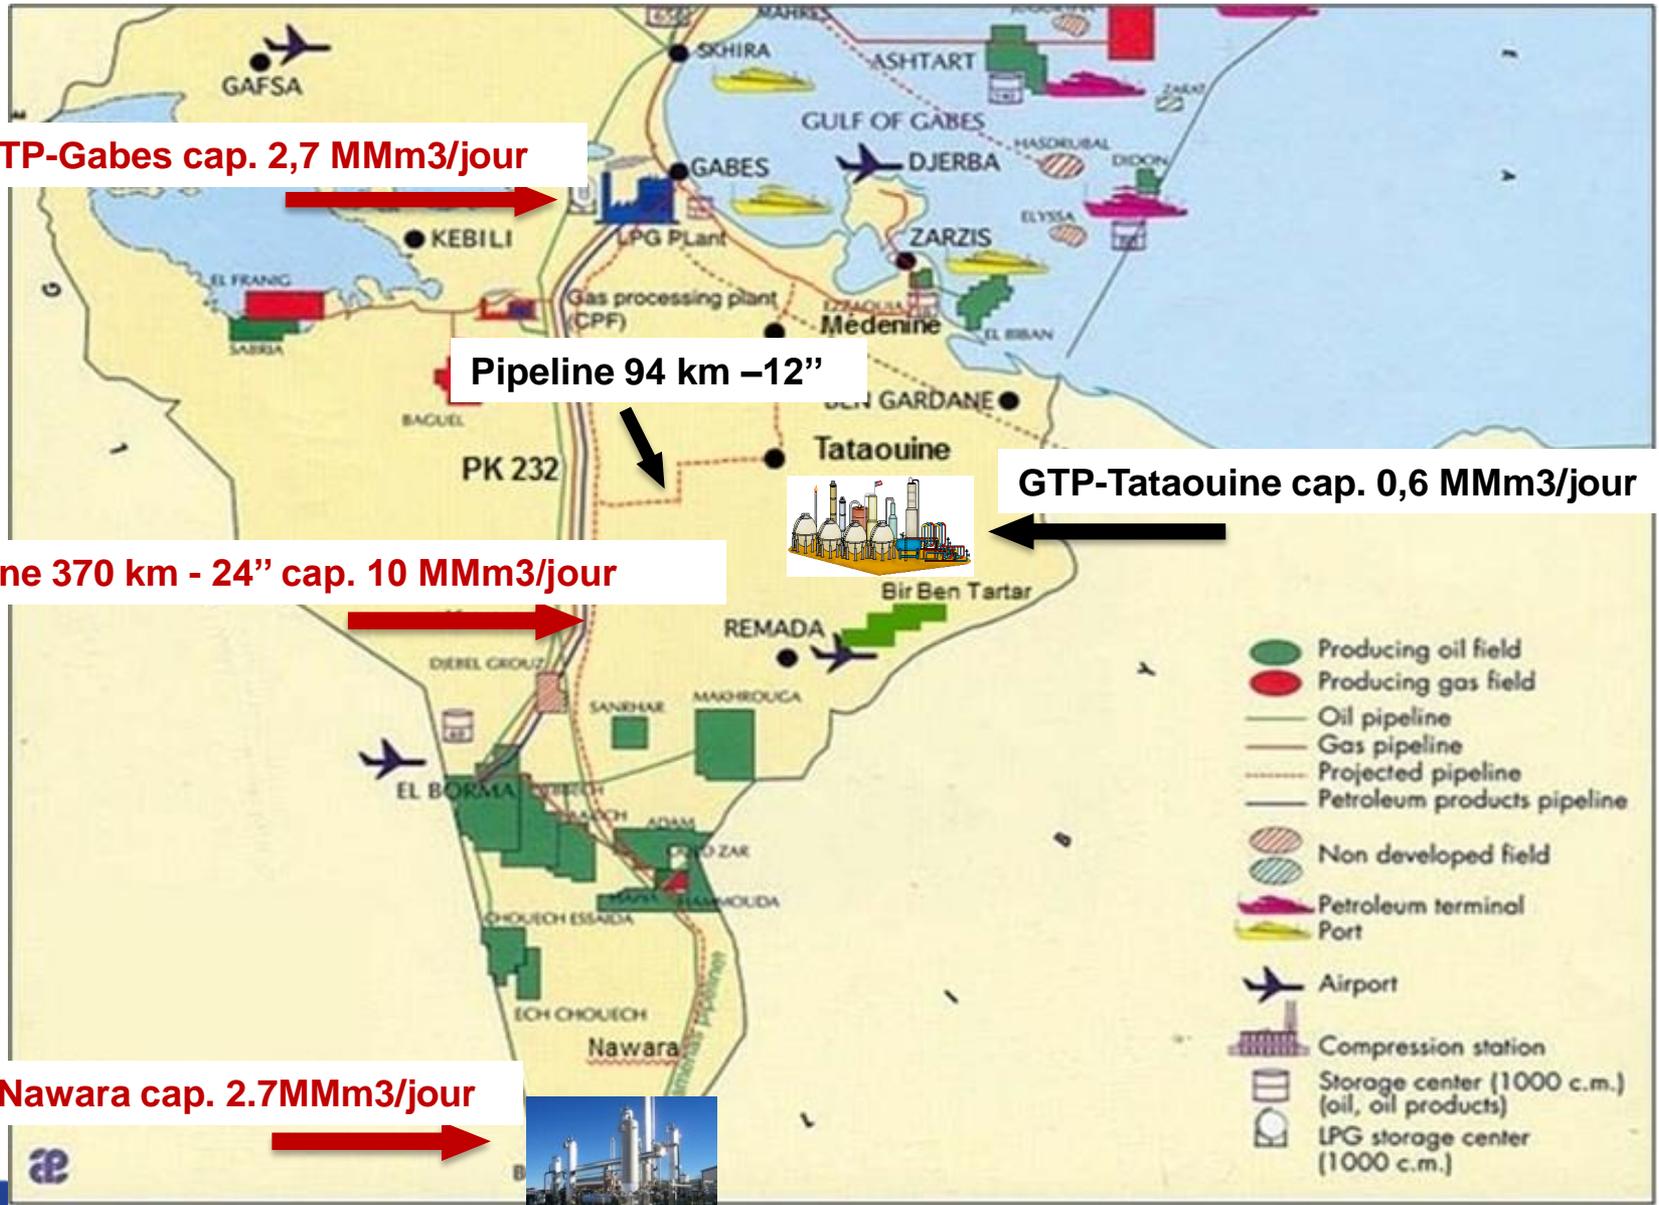


PLAN DE DEVELOPPEMENT

NAWARA CPF (EPC1)

PIPELINE (EPC2)

GTP - GABES (EPC3)

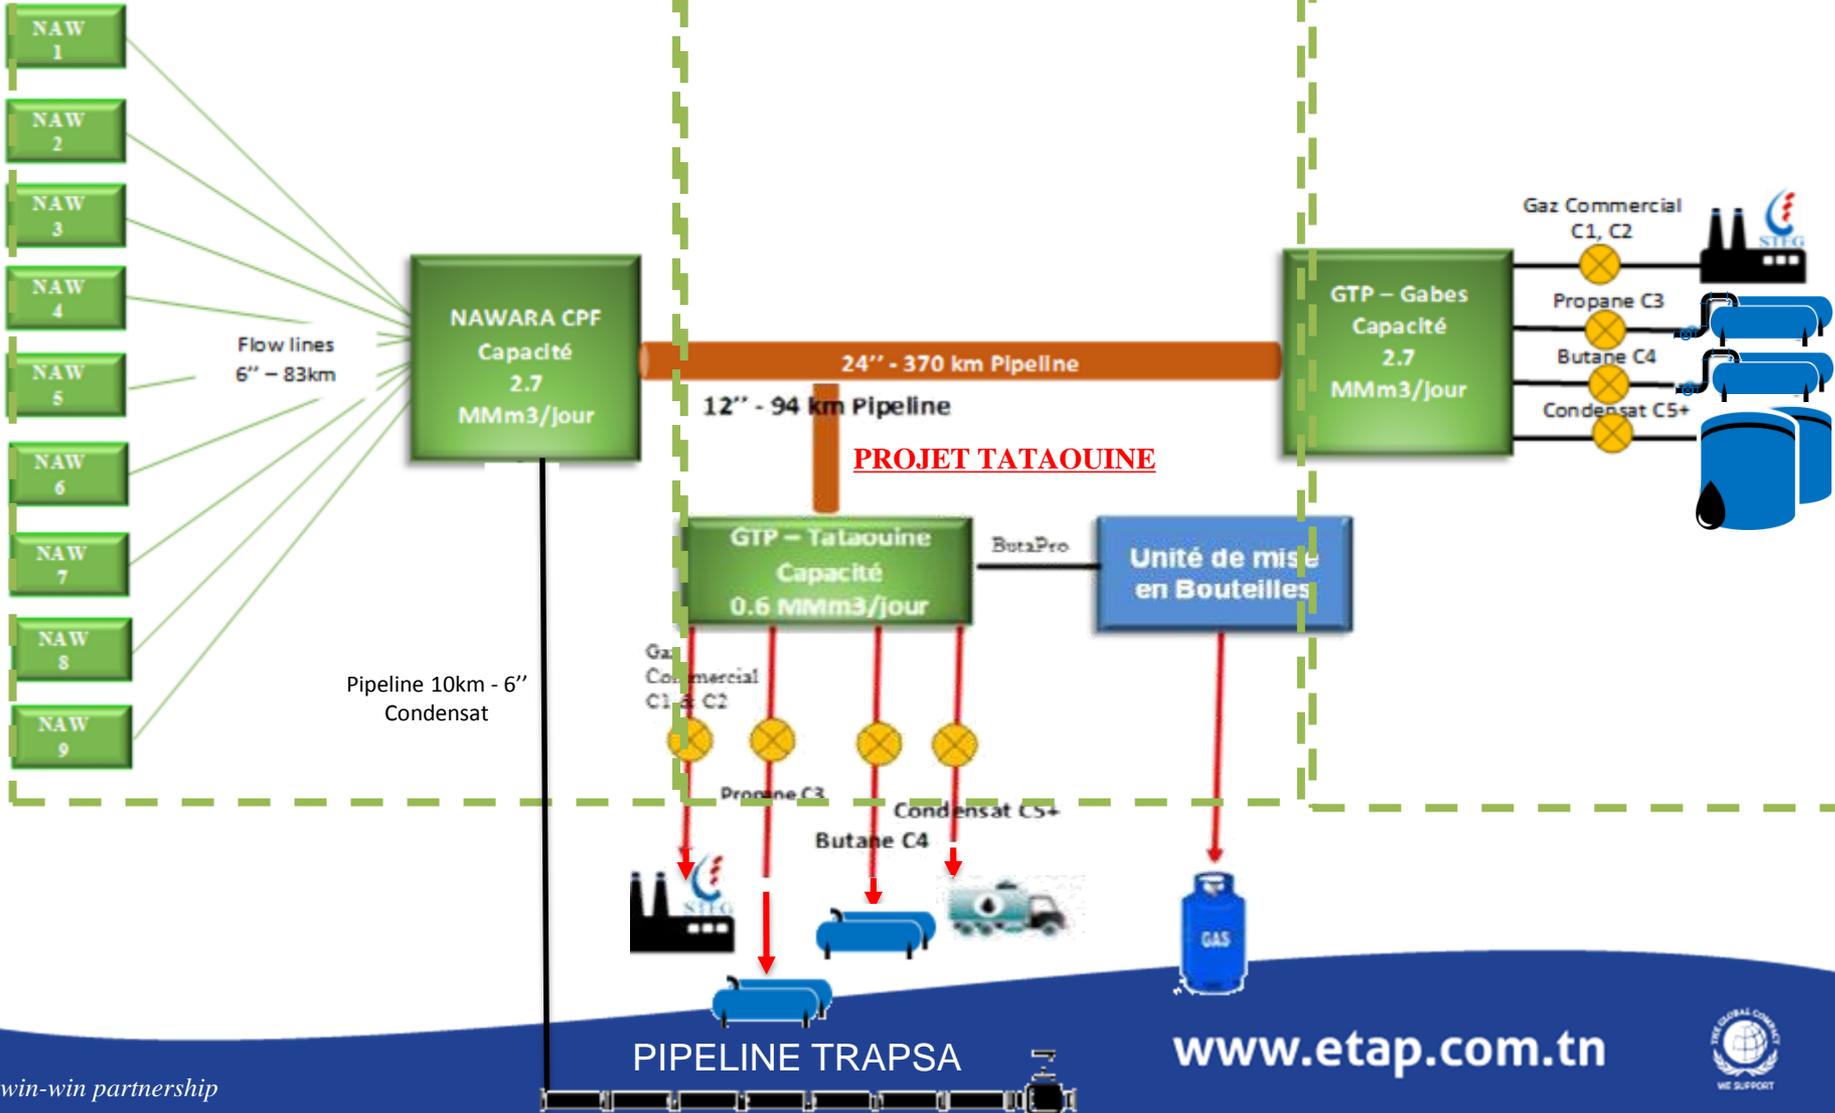

Investissement Projet NAWARA

MMUSD	
Phase Exécution	1060
Pipelines	300
CPF, Flowlines, Wellsites	360
Gas Treatment Plant (GTP-G)	350
Piste d'atterrissage et Routes	20
Cartier Vie à Nawara	30
Phase Exploitation (Future Développement)	43
Future Compression en amont de Nawara CPF	31
Puits de Développement	12



Investissement Projet TATAOUINE

MMUSD	
Pipelines	50
GTP-T & B.U	80
Autres Frais (terrain, études, frais généraux...)	20
Total Investissements	150

Avancement du Projet NAWARA au Fin Février 2016 (ETAP & OMV)

LOTS	CPF (EPC1)	PPL (EPC2)	GTP-G (EPC3)	Projet Nawara (EPCC)
PROJET NAWARA	15%	24%	58%	45%

Avancement du Projet TATAOUINE (ETAP 100%)

- Cahiers des charges finalisés
- Rapport de dépouillement du Pipeline est soumis à la Commission Supérieur des Marchés (CSM)

Date prévu de mise en production: Septembre 2017



Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

DIFFICULTES D'ACQUISITION DE LA SERVITUDE DU PIPELINE

54, Avenue Mohamed V - 1002 Le Belvédère, Tunisie
Tél. : (+216) 71 28 53 00 - Fax : (+216) 71 90 22 82

www.etap.com.tn



Nawara PPL: Etat de Gestion des Servitudes (370 Km)



- ① **Zone de Tataouine: 217 Km**
 - ▶ Zone désertique, **Terres Acquises**
- ② **Zone de Kebili: 52 Km**
 - ▶ 3 Terres Collectives, **Contrats signés & payés**
- ③ **Zone de Médenine : 5 Km**
 - ▶ Conseils de gestion revendiquent 25Km au Gouvernorat Kebili
- ④ **Zone de Gabes : 96 Km**
 - ▶ 86 Km des terres, **Acquises**
 - ▶ **Terres Collectives: 3 Km**, à cause de conflits internes
 - ▶ **Terres Privées: 7 Km**, à cause des taux de servitude élevés exigés par les propriétaires.

Nawara PPL: Problèmes en Suspens

- ▶ Revendications des Comité de Gestion (C.G) des Terres Collectives (T.C) de Beni khedache ont causé:
 - Blocage d'accès à 32 Km de l'itinéraire dans les zones de Kebili & Medenine
 - 2 Machines de l'entrepreneur (niveleuse & chargeur) confisquées par les C.G des T.C depuis 10 Décembre 2015 (coût d'attente 1,2MMUSD/mois).
 - Refus de 7 Km d'accords de servitude des terres collectives à Kebili
 - 69 Km revendiqué par les C.G des T.C de Kebili Est (Avis reçu le 29 Janvier 2016)



Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières
المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

54, Avenue Mohamed V - 1002 Le Belvédère, Tunisie
Tél. : (+216) 71 28 53 00 - Fax : (+216) 71 90 22 82

www.etap.com.tn

